


ESTRUCTURA. FORJADOS
1/150

CUBIERTAS. AMPLIACIÓN Y GIMNASIO

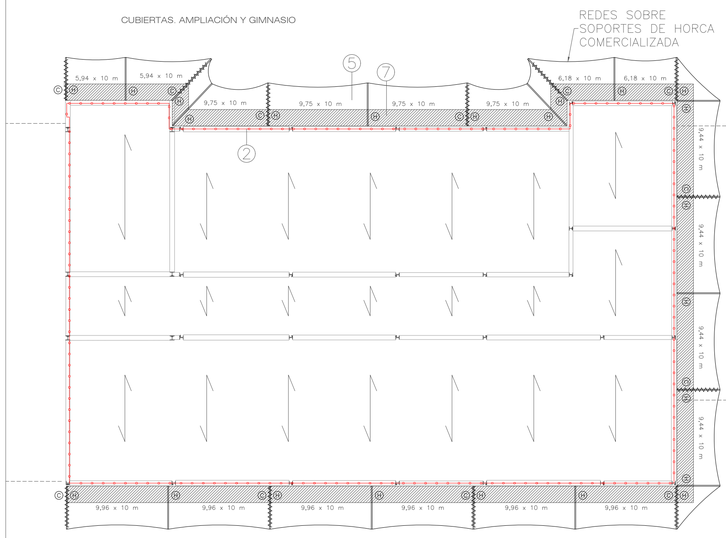

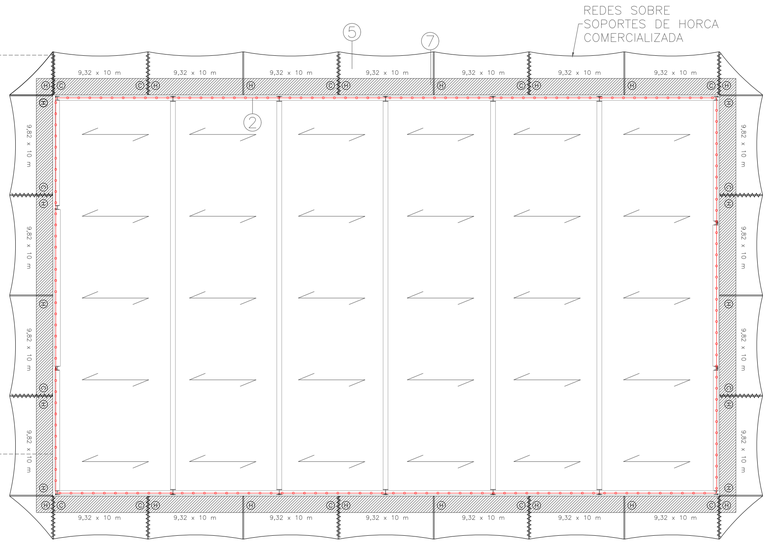

PLANTA PRIMERA Y CUBIERTA PORCHE

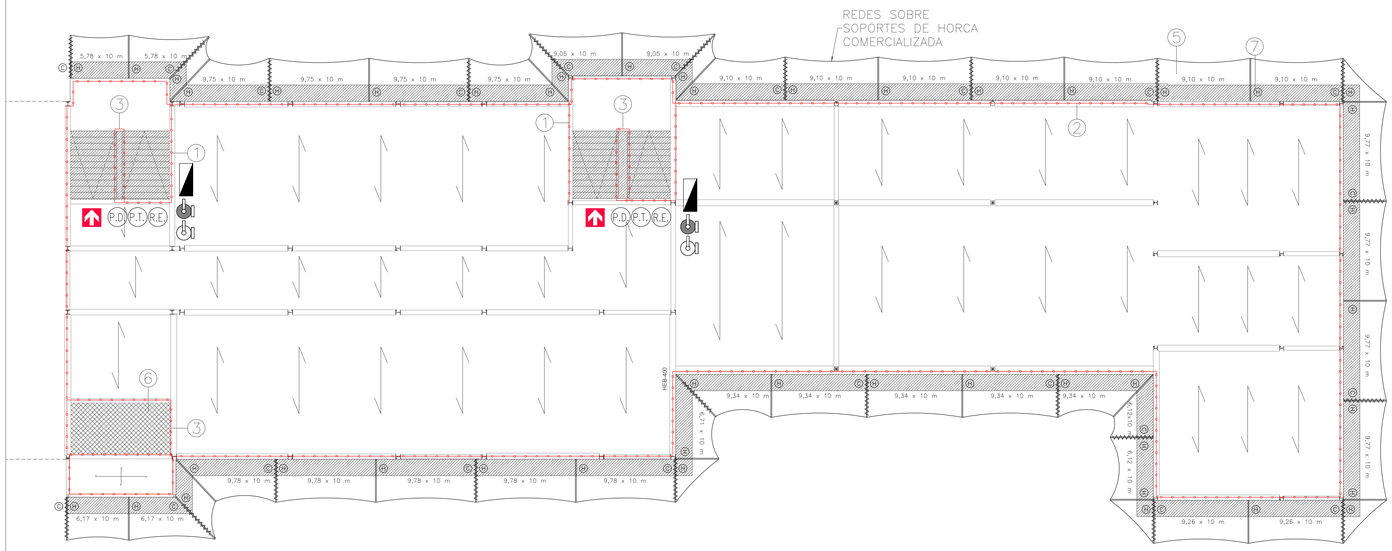

- (1) - BARANDILLA PROTECCIÓN ESCALERA
- (2) - BARANDILLA PROTECCIÓN PERIMETRAL
- (3) - BARANDILLA PROTECCIÓN DE HUECOS
- (4) - TAPA MADERA PARA HUECOS
- (5) - REDES PERIMETRALES TIPO "HORCA"
- (6) - RED HORIZONTAL EN HUECOS
- (7) - ENCOFRADO CUAJADO CON BARANDILLA PERIMETRAL
- (+) - SEÑAL BOTIQUÍN

HORCAS:

ALTURA: 8 m

VUELO: 2 m

TUBO: 50 x 100 x 4 mm

OMEGAS: Ø 16 mm

ANCLAJES INFERIORES: Ø 10 mm
CADA 50 cm EN BORDE

Ⓗ HORCA

Ⓒ COSIDO EN PAÑOS

6.5 DIMENSIÓN HORIZONTAL

RED: OLEFINE EN 1263-1 Y 2

CUERDAS: OLEFINE EN 1263-1 Y 2

BARANDILLA DE PROTECCIÓN


NOTAS:

TODA LA ORGANIZACIÓN DEL SOLAR SE MANTENDRÁ HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL GANCHO DE LAS GRÚAS MÓVILES PASARÁ 2m POR ENCIMA DE CUALQUIER ELEMENTO EN SU RADIO DE ACCIÓN.

LOS FORJADOS SE EJECUTARÁN CON ENCOFRADO CUAJADO PROVISTO DE BARANDILLA PERIMETRAL, LA CUAL SE SUSTITUIRÁ POR LA PERIMETRAL DE BORDE DE FORJADO AL COMENZAR EL DESENCOFRADO.

SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN FORJADOS



Dirección General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE

4 Unidades de ESO, Aulas específicas, y Gimnasio en el IES de Loeches

SITUACIÓN
Calle Tomillo c/v Avda. del Monte. 28890. Loeches (Madrid)

PLANO

SEGURIDAD Y SALUD FASE DE ESTRUCTURA FORJADOS

ESS03

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTOS
Jaime Martínez de Ubago de Liñán
Aldara Zuleta del Rivero

ESCALA DINA1
1/150

FECHA: OCTUBRE 2019

REVISADO: NOV 2019
